

[I1] Comentário: ADICIONAR
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO
COACHING NA EAP IDENTADA



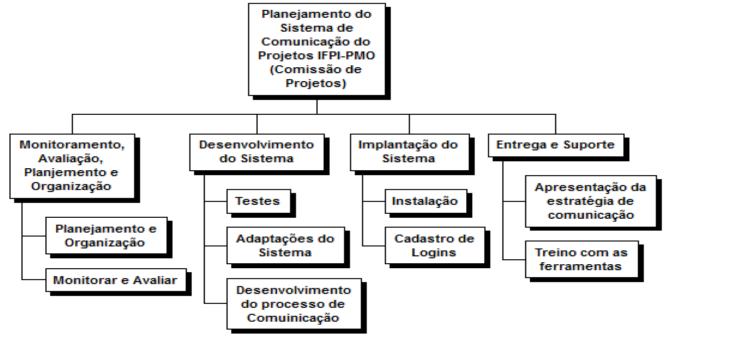

| DICIONÁRIO DA EAP | | | |
|--|------------------------------------|------------|--|
| PACOTE 1.1 Monitoramento, Avaliação, Planjemento e Organização: Planejamento e | | | |
| Organização | | | |
| Preparado | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 | |
| por: | | | |
| Aprovado | Henrique Flávio de Melo | 13/09/2012 | |
| por: | | | |

| Código EAP | ? | |
|-----------------|------------------------------------|----|
| Responsável | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | 20 |
| Prazo Estimado: | 14 dias | |
| Custo estimado: | 0 reais | |

Principais tarefas a serem realizadas

- Aprovar o comitê;
- Realizar o Diagnostico:
 - Analise swot;
 - Elaborar:
 - Check list 5W2H;
 - Matriz de Gerenciamento do Tempo do Campus;
 - A3 thinking;
 - Diagrama de ISHIKAWA
 - o Apresentação do Plano e execução (ciclo PDCA)
- Reunir equipe de usuarios;
 - Fazer braintorming de ideias de software que poderiam ser usados para realizarmos a comunicação do projeto;
 - o Ralização de entrevistas;
 - Pesquisa de videos e tutoriais;
- Definir o escopo dos trabalhos:
 - o Planejamento das próximas fases. A saber:
 - Desenvolvimento do Sistema
 - Implantação do Sistema
 - Entrega e Suporte
 - o Revisão dos Planos
- Aprovar o escopo dos trabalhos;

Recursos previstos

- Alan Kilson Departamento de Administração/Coordenação de Compras
- Professor Miguel
- Alain
- Sebastião Vinícius GP/TI
- Henrique Flávio Patrocinador

- Palestrante em Gestão de Projetos
- Palestrante em Trabalho à distância

Predecessores principais do pacote de trabalho

O único predecessor deste pacote é o "PACOTE 1.2: Monitoramento, Avaliação, Planejamento e Organização: Monitorar e Avaliar".

Sucessores Principais do pacote de trabalho

O principal sucessor deste pacote é o PACOTE 2.1: Desenvolvimento do Sistema: Desenvolvimento da estratégia de Comunicação.

Riscos associados ao pacote

- Risco das partes interessadas não se convencerem da importância/essencialidade do tema;
- Risco das Partes Interessadas não quererem se envolver nos assuntos de Gestão de Projetos;
- Risco dos usuários não terem tempo disponível para participar das reuniões;
- Risco dos usuários agendar a palestra e faltar na data;
- Risco de não haver estrutura mínima e funcionando no momento das reuniões;

| | DICIONÁRIO DA EAP | | |
|--|--|------------|--|
| PACOTE 1.2: Monitoramento, Avaliação, Planjemento e Organização: Monitorar e Avaliar | | | |
| Preparado | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 | |
| por: | | | |
| Aprovado | Henrique Flávio de Melo Rego de Barros | 13/09/2012 | |
| por: | | | |

| Código EAP | ? | |
|-----------------|------------------------------------|----|
| Responsável | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | |
| Prazo Estimado: | 7 dias | 20 |
| Custo | 0 reais | |
| estimado: | | |

Principais tarefas a serem realizadas

- Analise da maneira como os membros se comunicam atualmente
- Medição do Tempo Médio para se comunicar;
- Medição do custo médio para comunicação
- Observação das percepções dos membros quanto ao stress que sentem atualmente com o sistema atual;
- Provimento de metas de melhoria no sistema de comunicação atual do campus;

Recursos previstos

- Sebastião Vinícius –GP-TI
- Miguel Professor/Consultor Negócios
- Melina Técnico Administrativo
- Felipe Técnico Administrativo
- Will Jadson-Técnico Administrativo
- Josué –Assistente Administrativo
- Alan Kilson- Departamento de Administração/Coordenação de Compras
- José Ribeiro- Departamento de Administração/Coordenação de Orçamento
- Thaiza Departamento de Administração/Coordenação de Compras

Predecessores principais do pacote de trabalho

(não há)

Sucessores Principais do pacote de trabalho

PACOTE 1.1 Monitoramento, Avaliação, Planejamento e Organização: Planejamento e Organização.

Riscos associados ao pacote

Risco de não haver métricas para poder aplicar as atividades

Risco de as métricas não serem úteis;

Risco de não haver processo para aplicação eficiente e eficaz das métricas;

| DICIONÁRIO DA EAP: | | | |
|--|--|------------|--|
| PACOTE 2.1: Desenvolvimento do Sistema: Desenvolvimento do processo de | | | |
| Comunicação | | | |
| Preparado | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 | |
| por: | | | |
| Aprovado | Henrique Flávio de Melo Rego de Barros | 17/09/2012 | |
| por: | | | |

| Código EAP | ? | |
|-----------------|------------------------------------|--------|
| Responsável | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | |
| Prazo Estimado: | 7 semanas | |
| Custo | 0 reais | |
| estimado: | | • (_() |

Principais tarefas a serem realizadas

Modelagem do processo

Primeira Revisão individual

Segunda Revisão individual

Primeira reunião de avaliação de estratégia

Segunda Reunião de avaliação de Estratégia

Aprovação do processo

Recursos previstos

Sebastião Vinícius -Analista de Processos/TI

Membros da equipe do Projeto

Predecessores principais do pacote de trabalho

PACOTE 1.1 Monitoramento, Avaliação, Planjemento e Organização: Planejamento e Organização

Sucessores Principais do pacote de trabalho

PACOTE 2.1: Desenvolvimento do Sistema: Aptações do Sistema

Riscos associados ao pacote

Risco do processo não refletir a realidade atual;

Risco dos usuários e membros não seguirem o processo;

Risco dos usuários não entenderem a notação utilizada para descrever o processo.

| DICIONÁRIO DA EAP: | | | |
|--------------------|---|------------|--|
| PACO | PACOTE 2.2: Desenvolvimento do Sistema: Adaptações do Sistema | | |
| Preparado | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 | |
| por: | | | |
| Aprovado | Henrique Flávio de Melo Rego de Barros | 18/09/2012 | |
| por: | | | |

| Código EAP | 1 | |
|-----------------|------------------------------------|--------|
| Responsável | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | |
| Prazo Estimado: | 14 dias | |
| Custo | 0,00 | |
| estimado: | | • (_() |

Principais tarefas a serem realizadas

Preparação de ambiente de desenvolvimento do sistema

Compilação do sistema

Montagem dos links.

Recursos previstos

Sebastião Vinícius – Engenharia de Requisitos/TI Sebastião Vinícius – Engenheiro de Software/TI

Predecessores principais do pacote de trabalho

O único predecessor é o PACOTE 2.1: Desenvolvimento do Sistema: Desenvolvimento do processo de Comunicação

Sucessores Principais do pacote de trabalho

O único e principal pacote sucessor é o PACOTE 2.3: Desenvolvimento do Sistema :Testes

Riscos associados ao pacote

Risco de Alterações no escopo atrasarem a compilação do sistema; Risco de Falhas no software atrasarem ou inviabilizarem a entrega do pacote no prazo; Proposial ligo, reilisabla

| | DICIONÁRIO DA EAP: | |
|-----------|--|------------|
| | PACOTE 2.3: Desenvolvimento do Sister | ma :Testes |
| Preparado | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| por: | | |
| Aprovado | Henrique Flávio de Melo Rego de Barros | 18/09/2012 |
| por: | | |

| Código EAP | | 2.0 |
|-----------------|------------------------------------|-----|
| Responsável | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | |
| Prazo Estimado: | | 9 |
| Custo | | |
| estimado: | | |

Principais tarefas a serem realizadas

- Teste caixa preta Apresentação do sistema beta para os usuários utilizarem
- Teste caixa branca
- Teste de Integração

Recursos previstos

Sebastião Vinicius Araújo de Moura – Analista de Testes/TI

Sebastião Moura - Engenheiro de software/TI

Todos os Membros da equipe do Projeto

Predecessores principais do pacote de trabalho

O predecessor é PACOTE 2.2: Desenvolvimento do Sistema: Adaptações do Sistema.

Sucessores Principais do pacote de trabalho

O principal sucessor deste pacote é PACOTE 3.1: Implantação do Sistema:Instalação

Riscos associados ao pacote

Risco dos teste não serem eficazes e eficientes;

Risco de iniciarem com atraso;

| DICIONÁRIO DA EAP: | | |
|--------------------|---|------------|
| | PACOTE 3.1: Implantação do Sistema:Instalação |) |
| Preparado | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| por: | | |
| Aprovado | Henrique Flávio de Melo | 18/09/2012 |
| por: | | |

| Código EAP: | | |
|-----------------|------------------------------------|----|
| Responsável: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | |
| Prazo Estimado: | 14 dias | 20 |
| Custo | 0,00 reais | |
| estimado: | | |

Principais tarefas a serem realizadas

Instalação do servidor Testes no servidor de produção

Recursos previstos

• Sebastião Vinícius – Analista de Suporte/TI;

Predecessores principais do pacote de trabalho

O predecessor principal PACOTE 2.3: Desenvolvimento do Sistema :Testes

Sucessores Principais do pacote de trabalho

- PACOTE 3.2: Implantação do Sistema: Cadastro de Logins
- Pacote 4.1: Entrega e Suporte: apresentação da estratégia de comunicação

Riscos associados ao pacote

Risco de levar mais tempo do que o previsto

Risco não iniciar na data prevista

Risco do sistema não ser compatível do hardware disponível

| DICIONÁRIO DA EAP: | | |
|--|------------------------------------|------------|
| PACOTE 3.2: Implantação do Sistema: Cadastro de Logins | | |
| Preparado | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| por: | | |
| Aprovado | Henrique Flávio de Melo | 18/09/2012 |
| por: | | |

| Código EAP: | | |
|-----------------|------------------------------------|--|
| Responsável: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | |
| Prazo Estimado: | 3 dias | |
| Custo | R\$0,00 | |
| estimado: | | |

Principais tarefas a serem realizadas

Criação de contas no sistema Cadastro de senhas Envio de senhas para usuários

Recursos previstos

Sebastião Vinícius -TI;

Predecessores principais do pacote de trabalho

O principal predecessor PACOTE 3.1: Implantação do Sistema:Instalação

Sucessores Principais do pacote de trabalho

PACOTE 4.1: Entrega e Suporte: Apresentação da estratégia de comunicação.

Riscos associados ao pacote

Não conseguir fazer no prazo; Não conseguir fazer o cadastro de logins;

| DICIONÁRIO DA EAP: | | |
|--|------------------------------------|------------|
| PACOTE 4.1: Entrega e Suporte: Apresentação da estratégia de comunicação | | |
| Preparado | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| por: | | |
| Aprovado | Henrique Flávio de Melo | 18/09/2012 |
| por: | | |

| Código EAP: | | |
|-----------------|------------------------------------|----|
| Responsável: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | |
| Prazo Estimado: | 3 dia | 20 |
| Custo | R\$0,00 | |
| estimado: | | |

Principais tarefas a serem realizadas

Elaboração de mapa mental para a apresentação da estratégia

Divisão dos mapas mentais para caberem em slides

Montagem da apresentação em arquivo .ppt

Recursos previstos

Sebastião Vinícius -TI;

Predecessores principais do pacote de trabalho

Os principais predecessores são:

- PACOTE 3.1: Implantação do Sistema:Instalação
- PACOTE 3.2: Implantação do Sistema Cadastro de Logins

Sucessores Principais do pacote de trabalho

PACOTE 4.2: Entrega e Suporte: Treino com as ferramentas.

Riscos associados ao pacote

Apresentação não didática; Não conseguir realizar a apresentação; A apresentação não conseguir o seu objetivo;

| DICIONÁRIO DA EAP: | | |
|--|------------------------------------|------------|
| PACOTE 4.2: Entrega e Suporte: Treino com as ferramentas | | |
| Preparado | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | Versão 0.1 |
| por: | | |
| Aprovado | Henrique Flávio de Melo | 18/09/2012 |
| por: | | |

| Código EAP: | | |
|-----------------|------------------------------------|----|
| Responsável: | Sebastião Vinícius Araújo de Moura | |
| Prazo Estimado: | 7dias | 20 |
| Custo | R\$0,00 | |
| estimado: | | |

Principais tarefas a serem realizadas

Treinamento;

Avaliação dos usuários sobre o treinamento;

Treinador aplica avaliação de aprendizado do sistema;

Avaliação do treinamento;

Divulgação do resultado da avaliações;

Recursos previstos

Sebastião Vinícius -TI;

Predecessores principais do pacote de trabalho

Os principais predecessores são:

- o PACOTE 3.1: Implantação do Sistema:Instalação
- o PACOTE 3.2: Implantação do Sistema Cadastro de Logins

Sucessores Principais do pacote de trabalho

Não há sucessores.

Riscos associados ao pacote

Treinamento não ser eficaz e eficiente para todos os alunos
